

***Deuxième partie :***

***ATTACHE 8 :***

***Informations sur le puits existants***

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU ( POULALLIER )

Entreprise:	EURODRILL SA
Client:	COLLIN JP
Maître d'oeuvre:	COLLIN JP
Exploitant:	COLLIN JP

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

Coordonnées : X 0 Y 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Date début de l'ouvrage : 08/06/1998

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 12/06/1998

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Responsable Chantier :

Date début pompage :

Profondeur hydrostatique/sol : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU ( POULALLIER )

Client: **COLLIN JP**  
 Maître d'oeuvre: **COLLIN JP**  
 Lieu de l'ouvrage :

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	8.00	Argile
8.00	17.00	Argile
17.00	36.00	Schistes et grès altérés
36.00	60.00	Schiste et grès fracturés

#### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	60.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

#### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
55.00	6.00

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	34.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	39.00	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

#### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	30.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
30.00	36.00	4"7/8	125.00	Ciment	Bentonite c300	Gravitaire			
36.00	60.00	4"7/8	125.00	Gravier	Silice roulée	Gravitaire	Roule	4.00-6.00	


# FORAGE D'EAU ( POULALLIER )

Client : COLLIN JP  
Maître d'oeuvre : COLLIN JP  
Localisation de l'ouvrage :

Travaux réalisés : 111  
du : 08/06/1998 au : 12/06/1998  
Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
X: 0  
Y: 0  
Z altitude sol: +0,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

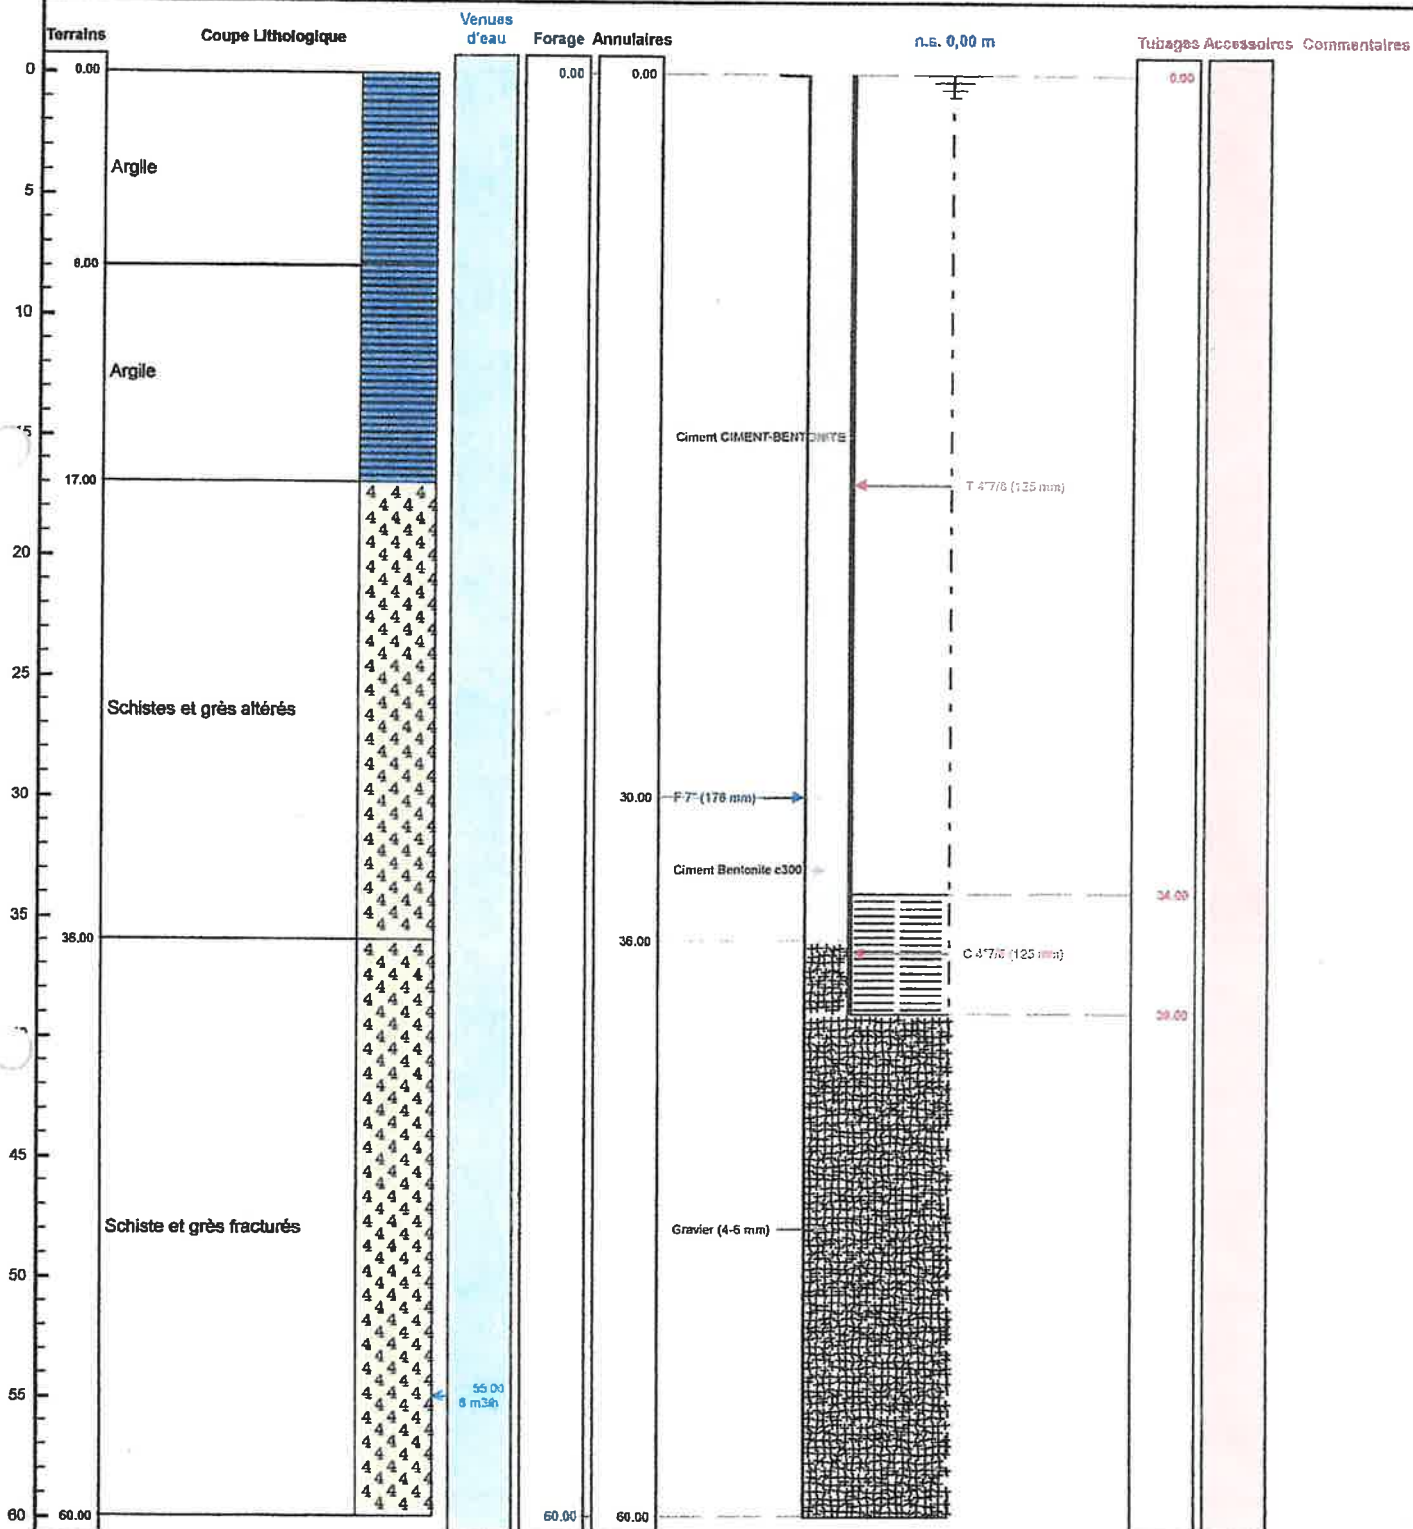

Le ..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique X: 0 Y: 0 Z: +0,000 m

PAGE: 3



**EURODRILL SA**

**Forage de puits  
et géothermie**

**Tél 04/368.38.88  
Fax 04/368.52.88**

**info@eurodrill.be  
www.eurodrill.be**  
Monsieur Collin,

**Le Réveil Avicole SPRL**

**Rue de l'Eglise, 7**

**4590 WARZEE**

Faisant suite à votre demande, nous avons réalisés pour votre compte en date du 22 novembre 2013 les travaux suivants :

**Puits « Maison » :**

- Mise en place d'un tube guide
- Mise en place compteur d'eau agréé
- Mise en place robinet pour prise d'échantillon



**Puits « Poulailler »**

- Mise en place d'un tube guide
- Mise en place compteur d'eau agréé
- Mise en place robinet pour prise d'échantillon
- Rehausse PVC du puits de 50 cm
- Pose d'un tubage acier diam 178mm
- Remonter bentonite jusqu'à 10 mètres, puis cimentation jusqu'à CV.

**Puits « abandonné poulailler »**

- Remplissage gravier jusqu'à niv stat 21 mètres
- 10 mètres de bentonite humidifiée à l'eau
- Cimentation du reste

Ainsi réalisés, ces travaux, conformes aux « règles de l'art » en vigueur, rendent vos puits en adéquation aux règles édictées par la SPW.

Fait à Chaudfontaine, ce 10 décembre 2013

Pour la SA EURODRILL,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Fr. Jeukenne

**Certificat d'étalonnage**  
**Attestation de conformité CE selon**  
**M.I.D**

Je soussigné, SA Eurodrill, rue de la Béole 116 à 4050 Chaudfontaine, Tel 04/368.38.88,  
TVA BE447.376.767

Certifie que le compteur type.....2000 - MJ - LFC.....


N°..C/M - 62.7337.....

Dont le calibre est de 32 mm est construit pour un débit permanent Q3 de 10 m³/h

Et qu'il a subi un contrôle d'étalonnage comme décrite dans les normes métrologiques CE  
selon M.I.D. relatives aux compteurs d'eau.

Il a été construit en conformité avec ces normes CE selon M.I.D. relatives aux compteurs  
d'eau.

Date et signature :

  
01.06.2013
